

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ДИМПЕН»

Л.Д. Красоченков.

«30» сентября 2020 года

М.П.



ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ И МАШИННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ,
проведенного по решению Общего Собрания Собственников
помещений МКД по адресу: г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д. 11, к.
2от 05.04.2020г. Договор №3-п от «25» мая 2020 г

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПОДЪЕЗД № 1 ЛИФТЫ:

✓ Регистрационный № 156027 .

Работы	Статус
Замена КВШ. (закупка).	Выполнено
Установить крышку тормоза (закупка)	Выполнено
Замена ограничителя скорости (закупка)	Выполнено
Замена пускателей главного привода -4 шт. (закупка)	Выполнено
Установить ограждение кабины (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей кабины -4шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок кабины-4шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок противовеса-4шт. (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей противовеса -4шт. (закупка)	Выполнено
Установить кнопку СТОП в приемке -1шт. (замена)	Выполнено
Регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)	Выполнено
Окраска кабины и порталов лифтов	Выполнено
Ремонт машинного помещения.	Выполнено
Замена подпольного контакта грузовзвеса кабины лифта.	Выполнено
Модернизация (замена плафонов освещения и установка аварийного освещения кабины лифта, фотореверса, поручней)	Выполнено

✓ Регистрационный № 156023 .

Работы	Статус
Замена КВШ. (закупка).	Выполнено
Замена ограничителя скорости (закупка)	Выполнено
Укоротить вытянутые троса (кабина) и (противовес).	Выполнено
Замена пускателей (катушка 110В) -4шт. (Закупка)	Выполнено
Установить ограждение кабины (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей кабины -4шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок кабины-4 шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок противовеса-4 шт. (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей противовеса -4шт. (закупка)	Выполнено
Установить кнопку СТОП в приемке -1шт. (замена)	Выполнено
Регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)	Выполнено
Замена роликов ДШ, ДК (дверей шахты, кабины) -20шт. (закупка)	Выполнено
Замена подпольного контакта грузовзвеса кабины лифта.	Выполнено
Окраска кабины и порталов лифтов	Выполнено
Модернизация (замена плафонов освещения и установка аварийного освещения кабины лифта, фотореверса, поручней)	Выполнено

ПОДЪЕЗД №1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена замена КВШ.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена работа по установке крышки тормоза



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена замена ограничителя скорости



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена замена пускателей главного привода -4 шт.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена работа по установке ограждения кабины.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена замена вкладышей кабины -4шт.

Произведена работа по установке масленок кабины-4шт.

Произведена работа по установке масленок противовеса-4 шт.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена работа по установке кнопки СТОП в прямке -1шт.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена работа по окраске кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведен ремонт машинного помещения.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156027.

Произведена замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена замена КВШ.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена замена ограничителя скорости



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена работа по укорачиванию троса (кабина) и (противовес).



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Замена пускателей (катушка 110В) -4шт.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023
Произведена установка ограждения кабины



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена замена вкладышей кабины -4шт.
Произведена установка масленок кабины-4 шт.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена установка кнопки СТОП в прямке -1шт.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена замена роликов ДШ, ДК (дверей шахты, кабины) -20шт.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 1. Лифт Рег. № 156023.

Произведена работа по окраске кабины лифта.



Оборудование, установленное в процессе модернизации

1.



Устройство оповещения и контроля дверного проема лифтовое КАПЕЛЬ-2ЛК



2.



Поручень кабины лифта



3.



Аварийное освещение кабины лифта

Замена и Ремонт данного оборудования произведён.

Акты проверки готовности и исправности оборудования.
Разрешения запуска в эксплуатацию

IV
ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИТЕЭЭЛ»
121339, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корпус 2, этаж подпольный, пом. VI, ком. 1, 6, 7, 9, 20
Агентство аккредитации ИЦ № ИА. RU. 210618

Акт
частичного технического освидетельствования лифта

«10» 07 2020г.

Мною, специалистом Самовол М.Т., проведено частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после замены КВЦ, управление скоростью, консоль КС.
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 156527
Адрес установки: г. Москва, ул. Б-я Конюховская, д. 11, к. 01 2, п. 10.

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
3. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
4. Функционирование лифта, в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
5. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.


Таблица 1

Номер требования	Невыполненные требования. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено	Рекомендуемый срок устранения*



* Заполняется в формате - до к - 20 г.

Рекомендации

Специалист испытательной лаборатории (центра)


(подпись, штамп)

(ФИО)

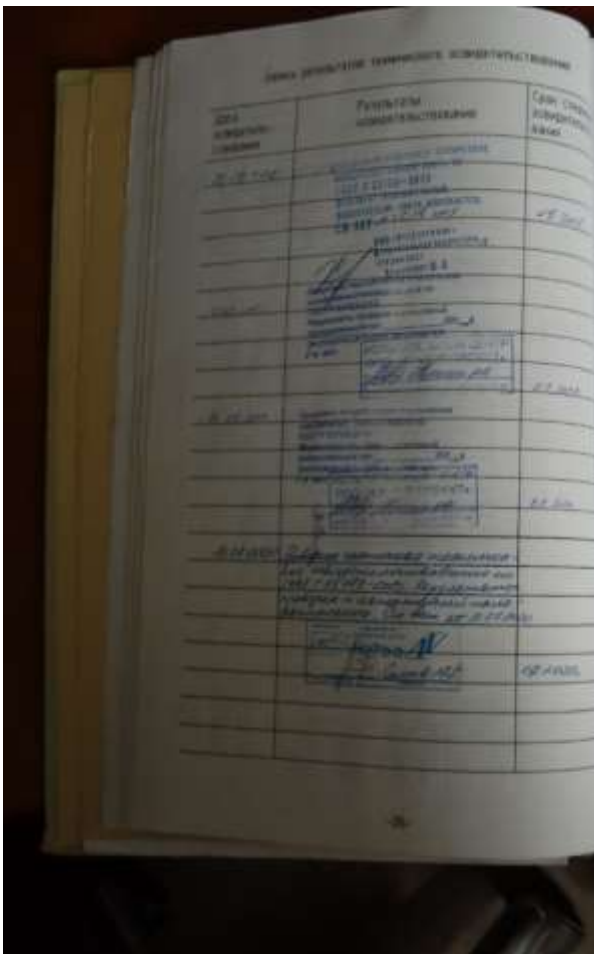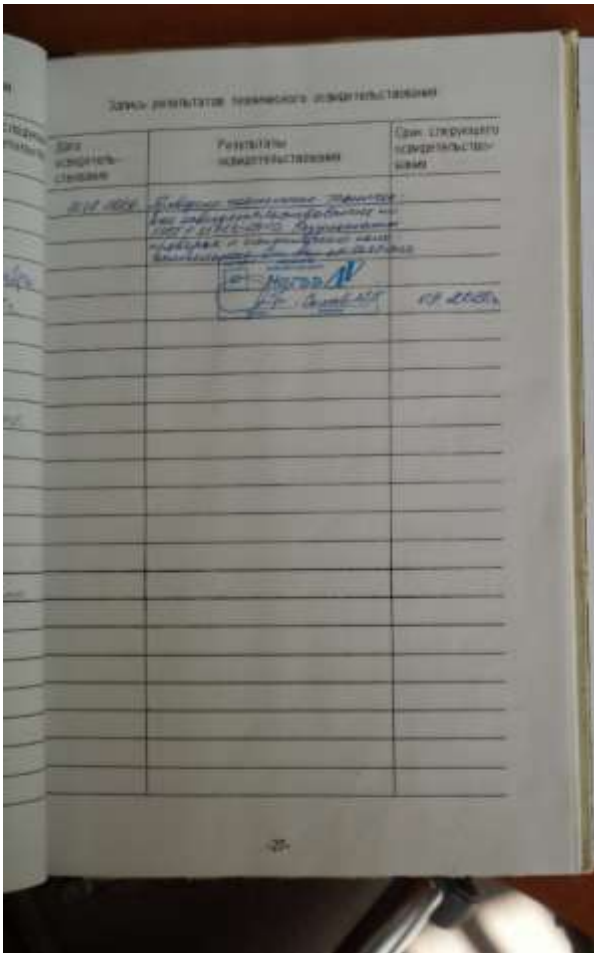



ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «НЕТЭЭЛ»

121359, г. Москва, ул. Мещеряка Тимошенко, д. 17, корпус 2, этаж подземный, пом. VI, ком. 1, 6, 7, 9, 20
Адрес регистрации ИЦ № ВА, Ю. 2100118

Акт

частичного технического освидетельствования лифта

« 10 » 04 2020.

Мною, специалистом Самовым М.Т., проведено частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после замены КВМ, огражающей скорости, кабанг СК
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 158023
Адрес установки: г. Москва, ул. Б-я Консуловская, д. 11, к. (X) 2, п. 1а.

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
3. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
4. Функционирование лифта, в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
5. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.

Таблица 1

Номер требования	Невыполненные требования. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено	Рекомендуемый срок устранения*

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Специалист испытательной лаборатории (центра)



(подпись, штамп)

(ФНО)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПОДЪЕЗД № 2 ЛИФТЫ:

✓ Регистрационный № 156026.

Работы	Статус
Замена ограничителя скорости (закупка)	Выполнено
Отсутствует кожух закрывающий шкивок привода дверей-(закупка)	Выполнено
Установить ограждение кабины (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей кабины -4шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок кабины-4 шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок противовеса-4 шт. (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей противовеса -4шт. (закупка)	Выполнено
Установить кнопку СТОП в прямке -1шт. (замена)	Выполнено
Регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)	Выполнено
Замена роликов ДШ, ДК (дверей шахты, кабины) -20шт. (закупка)	Выполнено
Ремонт Машинного помещения.	Выполнено
Замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.	Выполнено
Окраска кабины и порталов лифтов	Выполнено
Модернизация (замена плафонов освещения и установка аварийного освещения кабины лифта, фотореверса, поручней)	Выполнено

✓ Регистрационный № 156024.

Работы	Статус
Замена ограничителя скорости (закупка)	Выполнено
Замена подшипника эл.двигателя главного привода (закупка).	Выполнено
Установить ограждение кабины (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей кабины -4шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок кабины-4 шт. (закупка)	Выполнено
Установка масленок противовеса-4 шт. (закупка)	Выполнено
Замена вкладышей противовеса -4шт. (закупка)	Выполнено
Укоротить вытянутый трос (ограничителя скорости).	Выполнено
Установить кнопку СТОП в прямке -1шт. (замена)	Выполнено
Регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)	Выполнено
Замена роликов ДШ, ДК (дверей шахты, кабины) -20шт. (закупка).	Выполнено
Замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.	Выполнено
Окраска кабины и порталов лифтов	Выполнено

Заменен указатель этажа.	Выполнено
Модернизация (замена плафонов освещения и установка аварийного освещения кабины лифта, фотореверса, поручней)	Выполнено

ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.
Произведена замена ограничителя скорости



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.
Произведена установка кожуха закрывающий шкивок привода дверей



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.

Произведена установка масленок противовеса-4 шт.

Произведена замена вкладышей противовеса -4шт.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026

Произведена установка кнопки СТОП в приемке.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.

Произведена регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.

Произведена установка ограждения кабины



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.

Произведена замена вкладышей кабины -4шт.

Произведена установка масленок кабины-4 шт.




ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.

Произведена замена роликов ДШ, ДК (дверей шахты, кабины) -20шт.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156026.

Произведен ремонт машинного помещения.

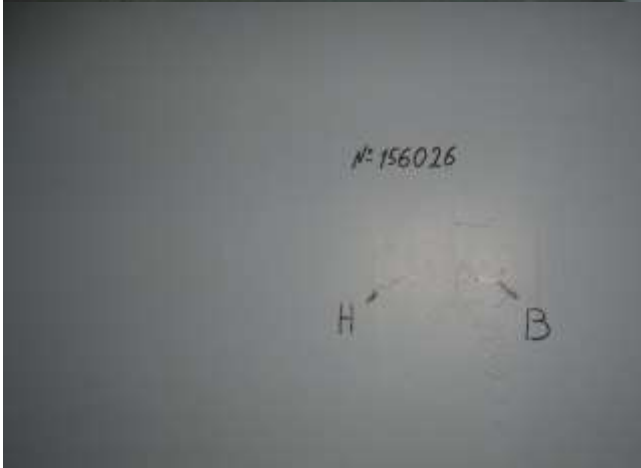

ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. Рег. 156026.

Произведена замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. № 156026.

Произведена окраска кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024.

Произведена замена ограничителя скорости.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024.

Произведена замена подшипника эл. двигателя главного привода.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024.
Произведена установка ограждения кабины



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024.
Произведена установка масленок противовеса-4 шт.
Произведена замена вкладышей противовеса -4шт.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024.

Произведена замена вкладышей кабины -4шт.

Произведена установка масленок кабины-4 шт.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024.

Произведена регулировка направляющих КАБИНЫ лифта (ШТИХМАС)



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024.


Произведена установка кнопки СТОП в приемке.

Произведена работа по укорачиванию троса (ограничителя скорости).



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. 156024

Произведена замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.

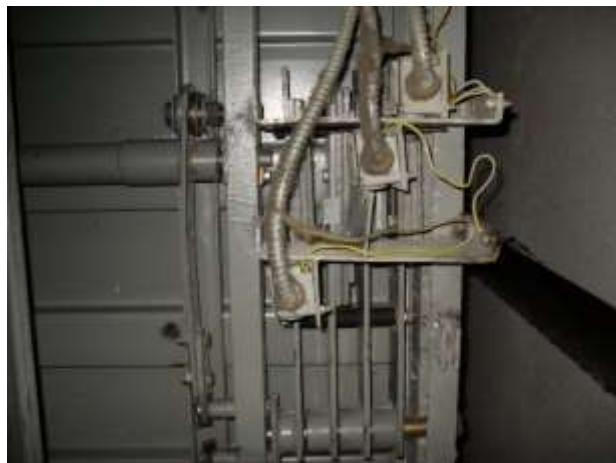

ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. № 156024.

Произведена окраска кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 2. Лифт Рег. № 156024.
Произведена замена указателя табло лифта.



Оборудование, установленное в процессе модернизации

1.



Устройство оповещения и контроля дверного проема лифтовое КАПЕЛЬ-2ЛК



2.



Поручень кабины лифта




3.



Аварийное освещение кабины лифта

Замена и Ремонт данного оборудования произведён.

Акты проверки готовности и исправности оборудования.
 Разрешения запуска в эксплуатацию.


ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «НЕТЭЭЛ»
 121378, г. Москва, Ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корпус 2, этаж почтовый, пом. VI, ком. 1, 6, 7, 9, 20
 Акты при регистрации ИП № РА. РЦ. 2100118

Акт
 частичного технического освидетельствования лифта

«28» 05 2020 г.

Мною, специалистом Семовым М.Т., проведено частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после замены префиксатора скорости лифта
 Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 156 024
 Адрес установки: г. Москва, ул. Б. Хомутовские, д. Н, к. (ф.) Е, п. 2А

Результаты технического освидетельствования лифта


1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
3. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
4. Функционирование лифта в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
5. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.

Таблица 1

Номер требования	Невыполненные требования, выявленные дефекты, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено	Рекомендуемый срок устранения*

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Специалист испытательной лаборатории (центра) _____

 (подпись, инициал) _____ (ФИО) _____



Акт

частичного технического освидетельствования лифта

« 28 » 09 2010 г.

Мною, специалистом Савилов М.Т., проведено частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после замены КВМ, тросов канатов, дренажной системы
 Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 158026
 Адрес установки: г. Москва, ул. б-я Консуловская, д. 11, к/д/л, п. С

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
3. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
4. Функционирование лифта, в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
5. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.

Таблица 1

Номер требования	Невыполненные требования, выявленные дефекты, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено	Рекомендуемый срок устранения*



* Записывается в формате « до » « » 20 г.

Рекомендации

Специалист испытательной лаборатории (центра)

(подпись, штамп)

(ФИО)

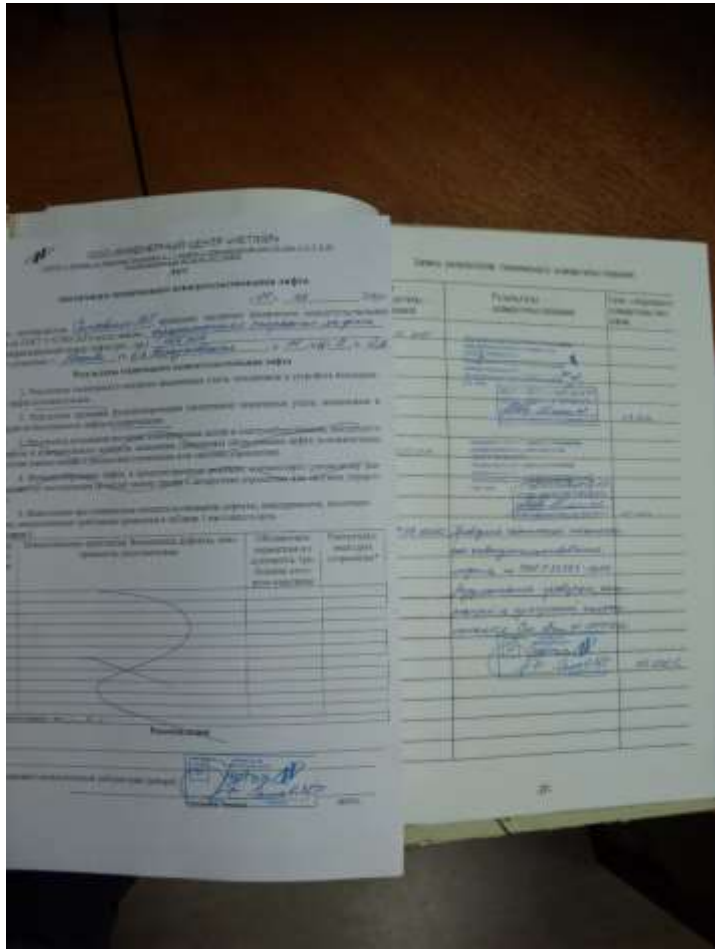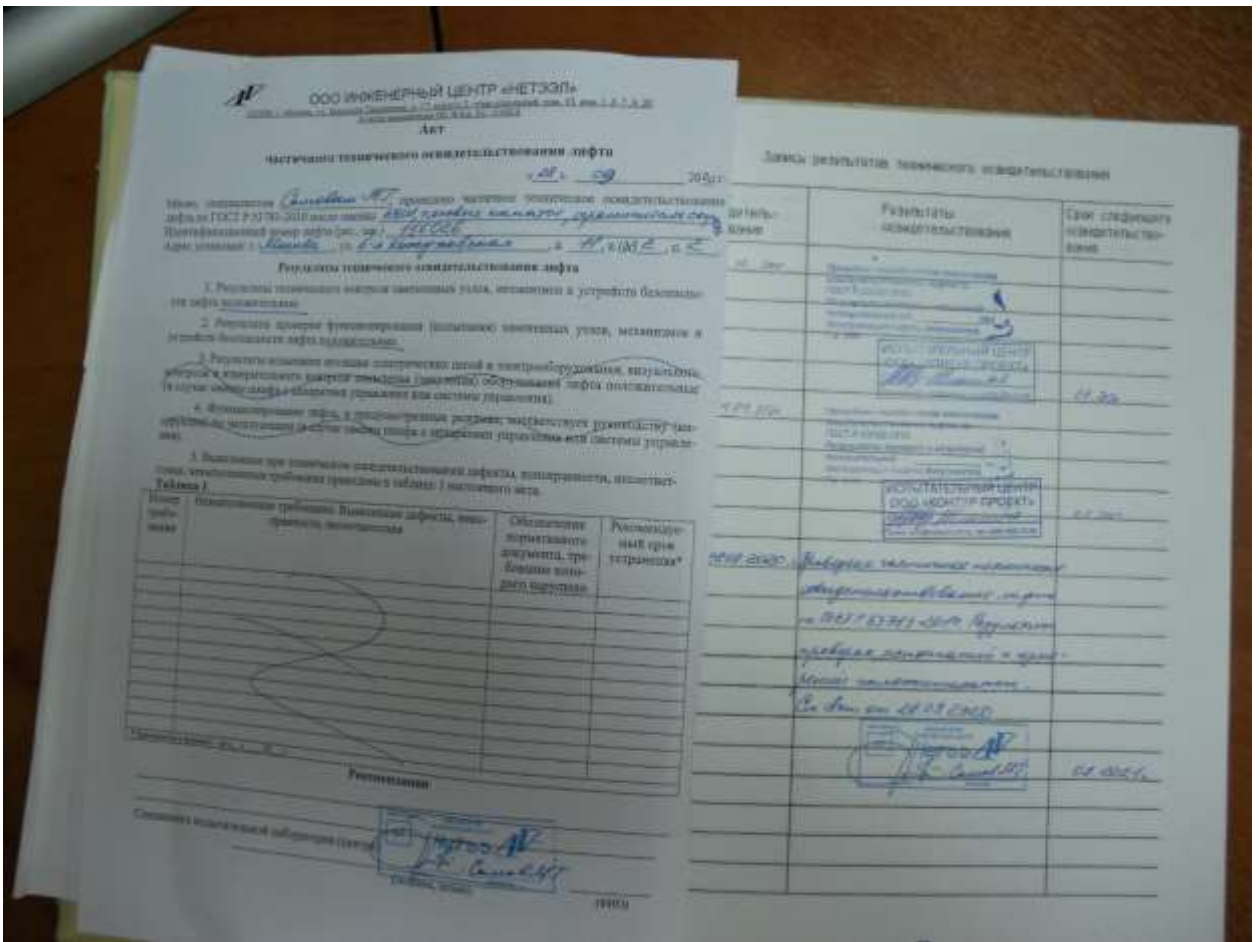

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПОДЪЕЗД № 3, ЛИФТЫ:

Регистрационный № 156025

Работы	Статус
Замена ограничителя	Выполнено
Замена отводного блока (нарезка)	Выполнено
Не работает пульт ревизии	Выполнено
Замена вкладышей кабины и противовеса	Выполнено
Установка масленок кабина и противовеса	Выполнено
Замена тросов	Выполнено
Уборка кабины и приямка от мусора	Выполнено
Регулировка натяжного устройства	Выполнено
Сделать ограждений кабины	Выполнено
Требуется регулировка штихмаса	Выполнено
В приямке установить кнопку стоп согласно техническому регламенту	Выполнено
Замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.	Выполнено
Окраска кабины и порталов лифтов	Выполнено
Модернизация (замена плафонов освещения и установка аварийного освещения кабины лифта, фотореверса, поручней)	Выполнено

Регистрационный №156022

Работы	Статус
Замена пружины главного тормоза	Выполнено
Замена ограничителя скорости	Выполнено
Уборка кабины от мусора	Выполнено
Установка ограждения кабины	Выполнено
Замена вкладышей противовеса	Выполнено
Установка масленок противовеса	Выполнено
Требуется регулировка штихмаса	Выполнено
Уборка приямка от мусора	Выполнено
В приямке установить кнопку «стоп» согласно техническому регламенту	Выполнено
Ремонт машинного помещения	Выполнено
Замена роликов ДК ДШ	Выполнено
Замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.	Выполнено
Замена вкладышей кабины.	Выполнено
Окраска кабины и порталов лифтов	Выполнено
Модернизация (замена плафонов освещения и установка аварийного освещения кабины лифта, фотореверса, поручней)	Выполнено

ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.
Произведена замена ограничителя скорости



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.
Произведена замена отводного блока



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.
Произведен ремонт пульта ревизии



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.
Произведена замена вкладышей кабины и противовеса
Произведена установка масленок кабины и противовеса



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.
Произведена регулировка натяжного устройства



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.
Установлено ограждение кабины



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.

Произведена замена тросов
Произведена уборка кабины и прямка от мусора



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.

Произведена регулировка (ШТИХМАСА)



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.

Проведены работы по установке кнопки стоп согласно техническому регламенту



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156025.

Произведена замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. № 156025.

Произведена окраска кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.

Произведена замена пружины главного тормоза



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.

Произведена замена ограничителя скорости



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.

Произведена уборка кабины от мусора

Произведена работа по установке ограждения кабины



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.

Произведена замена вкладышей противовеса
Произведена установка масленок противовеса



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.

Произведена регулировка (ШТИХМАСА)



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.

Произведена уборка приемка от мусора
Произведена работа по установке кнопки «стоп» в приемке лифта согласно
техническому регламенту



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.

Произведен ремонт машинного помещения



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.
Произведена замена роликов ДК ДШ



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.
Произведена замена подпольного контакта грузозвеса кабины лифта.



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.
Произведена замена вкладышей кабины.



ПОДЪЕЗД № 3. Лифт Рег. 156022.
Произведена окраска кабины лифта.



Оборудование, установленное в процессе модернизации

1.



Устройство оповещения и контроля дверного проема лифтовое КАПЕЛЬ-2ЛК



2.



Поручень кабины лифта




3.



Аварийное освещение кабины лифта

Замена и Ремонт данного оборудования произведён.

Акты проверки готовности и исправности оборудования. Разрешения запуска в эксплуатацию



ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «НЕТЭЭЛ»
 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корпус 2, этажцокольный, пом. VI, ком. 1, 6, 7, 9, 20
 Агентство аккредитации ИЦ № ИА, RU, 2116618

Акт
частичного технического освидетельствования лифта

« 25 » 08 20 21 г.

Мною, специалистом Самойлов М.Т. проведено частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после замены ограничителя скорости, створчатой будки
 Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 185025 Лободина
 Адрес установки: г. Москва, ул. 6-я Косюковская, д. 11, к. 2, п. 3А.

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
3. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
4. Функционирование лифта, в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
5. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.


Таблица 1

Номер требования	Невыполненные требования. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено	Рекомендуемый срок устранения*

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Специалист испытательной лаборатории (центра) _____



(подпись, печать)

(ФИО)



Акт

частичного технического освидетельствования лифта

«25» 08 2020 г.

Мною, специалистом Семовским М.Т. проведено частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 после замены тройные канаты, оптимизация скорости
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 156 В22, бывшей для лифта
Адрес установки: г. Москва, ул. в.д. Коммуналок, д. 11, к. (с) 2, п. 3 Б

Результаты технического освидетельствования лифта

1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
3. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
4. Функционирование лифта, в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
5. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.

Таблица 1

Номер требования	Невыполненные требования. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено	Рекомендуемый срок устранения*

* Заполняется в формате - до « » 20 г.


Рекомендации

Специалист испытательной лаборатории (центра)



(ФИО)

Запись результатов технического освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
10.07.2020.	Проведено частичное техническое освидетельствование по ГОСТ Р 33783-2010. Результатом проверки и оценочной части технического освидетельствования является:	
	 Инженерная фирма НЕТЭЭ Силин А.И.	09.2020.

Мног
лифт
Иден
Адрес

ст
ус
к
(
с
в
с
т

Н
т
в
.
.

Запись результатов технического освидетельствования

Дата следующего освидетельствования	Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования
кабры 17г	25.08.2020	<p>Проведено частное техническое освидетельствование мототранспорта по ГИО РБЗ+РЗ - 2010. Результаты проверок, неисправностей и изменений не выявлены.</p> <p>Выдана Акт от 25.08.2020.</p> <div data-bbox="778 719 1203 869" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>МОНГОЛ УЛСЫН ТЭХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОНГОЛ А. Аювсүрэн</p> </div>	
